Zählerschrankanfrage

Schiegl
SCHALTANLAGENBAU GmbH

per Fax 034443-20821 oder E-Mail: info@schiegl-schaltanlagenbau.de

Name	Kd.-Nr.
...	Telefon
Anschrift	Telefax
PLZ + Ort	E-Mail

Angaben zum Schrank

EVU / VNB : _____ **Projekt :** _____

Einsatzort : _____

Ausführung der Zählerplätze ☐ 3-PKT ☐ eHZ

Ausführung des Schrankes ☐ AP - IP43 ☐ AP - IP54 ☐ UP - IP30

Bauhöhe des Schrankes ☐ 1100 mm 1-stöckig / ARO 300 mm ☐ 1400 mm 2-stöckig / ARO 300 mm ☐ 950 mm 1-stöckig / ARO 150 mm ☐ 1250 mm 2-stöckig / ARO 150 mm

Nach VDE-AR-N 4101 vom 01.09.2015 sind die Bauhöhen 950 mm und 1250 mm (ARO 150 mm) nicht mehr zugelassen !

Auswahl der Felder

Anzahl eintragen:

_____ Zählerplätze (für Aussetzbetrieb ≤ 63A)

_____ Zählerplätze (für Dauerbetrieb ≤ 32A)

_____ Zählerplätze (für Dauerbetrieb ≤ 44A)

_____ Zähler-Reserveplätze (unverdrahtet)

_____ TSG-/Uhrenplatz (Steuersicherung siehe Zubehör)

_____ Verteilerfeld *min.*_____*-reihig*

_____ Verteilerfeld mit CU-Einspeisefeld

_____ Multimedia-/Telekommunikationsfeld

Siehe Auswahltabelle

Skizze

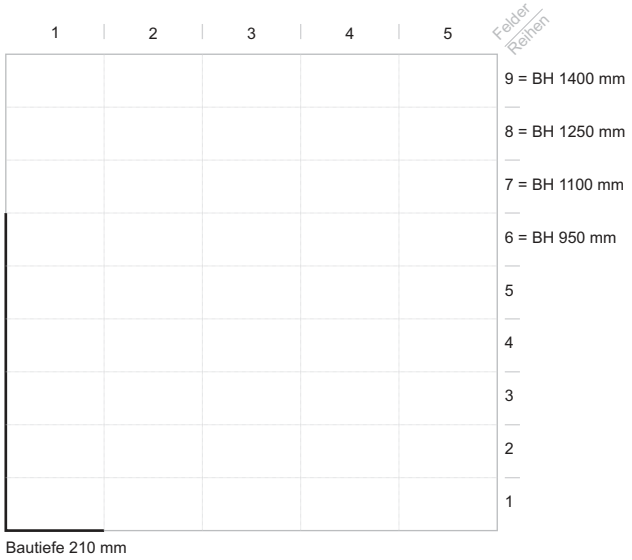

Zubehör

☐ HSA / SLS-Schalter: 25A 35A 40A 50A 63A

Ausführung 1-polig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Stk.

Ausführung 3-polig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Stk.

☐ TSG - Steuersicherung D01 1-polig ☐ 6A ☐ 10A

☐ TSG - Steuersicherung LS 1-pol. 25kA ☐ B6A ☐ B10A

☐ APZ - Ausbau (mit Lochplatte, RJ45-Box, Iso-Schlauch)

☐ APZ - Spannungsvers. D01 1-polig ☐ 6A ☐ 10A

☐ APZ - Spannungsvers. LS 1-pol. 25kA ☐ B6A ☐ B10A

☐ RJ45-Satz gem. VDE-AR-N 4101 ☐ Satz

☐ Optischer Kommunikationsadapter ☐ Stk.

☐ Bestückungspaket für Wärmepumpe (VNB-Spezifisch)

☐ Bestückungspaket für PV-Überschusseinspeisung

☐ Überspannungsableiter (Sammelschienenmontage)

☐ Einspeisegehäuse 120mm² Montage: ☐ seitlich ☐ unten

☐ Zählersteckklemme DS 63A komplett ☐ Stk.

☐ eHZ-Aufsetzadapter mit Klemmdeckel ☐ Stk.

☐ Schukosteckdose 2-fach (im TK-Feld) ☐ Stk.

☐ Schukosteckdose 3-fach (im TK-Feld) ☐ Stk.

☐ Gerätehalter (für Router etc.) ☐ Stk.
